GEB - Colectora
Colectora – Cuestecitas: 30/abr/2027. En construcción
Cuestecitas – La Loma: 30/sep/2026. Pendiente Energización

SAEB LA ARENOSA – Baterías: oct/2027.
Se emite por parte del Ministerio de Minas y Energía la Resolución MME 40324 del 2026 *"Por la cual se declara la pérdida sobreviniente de la Situación Especial que dio origen a la adjudicación del Proyecto de Almacenamiento de Energía con Baterías en la Subestación El Silencio 34.5 kV mediante Convocatoria Pública UPME STR 01 - 2021"*.

GEB – Refuerzo Suroccidental
Medellín – La Virginia:
En operación 30/jun/2024
La Viginia - Alférez:
Abr/2028. En construcción. Alerta de retrasos por riego sociopolítico.
Alférez – San Marcos:
En operación 17/dic/2025.


CELSIA - Pacífico
En junio de 2025, CELSIA desiste de la ejecución del proyecto. Pendiente declaratoria de abandono.

GEB – 2do Circuito Cuestecitas – La Loma:
30/sep/2026. Pendiente Energización

ISA – ITCO
La Loma - Sogamoso: oct/27
Obras en SEs finalizadas. LT en construcción desde feb/25. Modificación de LA No 1 y 2: Aprobadas subsanando las restricciones ambientales. Modificación de LA No 3: Radicada en junio. Alerta de retraso por riesgo sociopolítico y seguridad física.

GEB – Sogamoso/Norte/Nueva Esperanza:
Sep/2027
Avance en obra civil en la SE Norte 500 kV, aun cuando no se formalizó la entrega del lote por parte del proyecto (Chivor-Nte-Bacatá), prevista para el 20/jul/26.
En ajuste del EIA para radicar nuevamente la MLA 5 en sep/26.

GEB – Chivor/Norte/Bacatá: Jun/2027
Se reactiva la actividad constructiva.
ANLA se pronuncia sobre la MLA 2 "restricciones". En espera se revuelva el R.R interpuesto.
Avanza las actividades constructivas de la SE Norte.

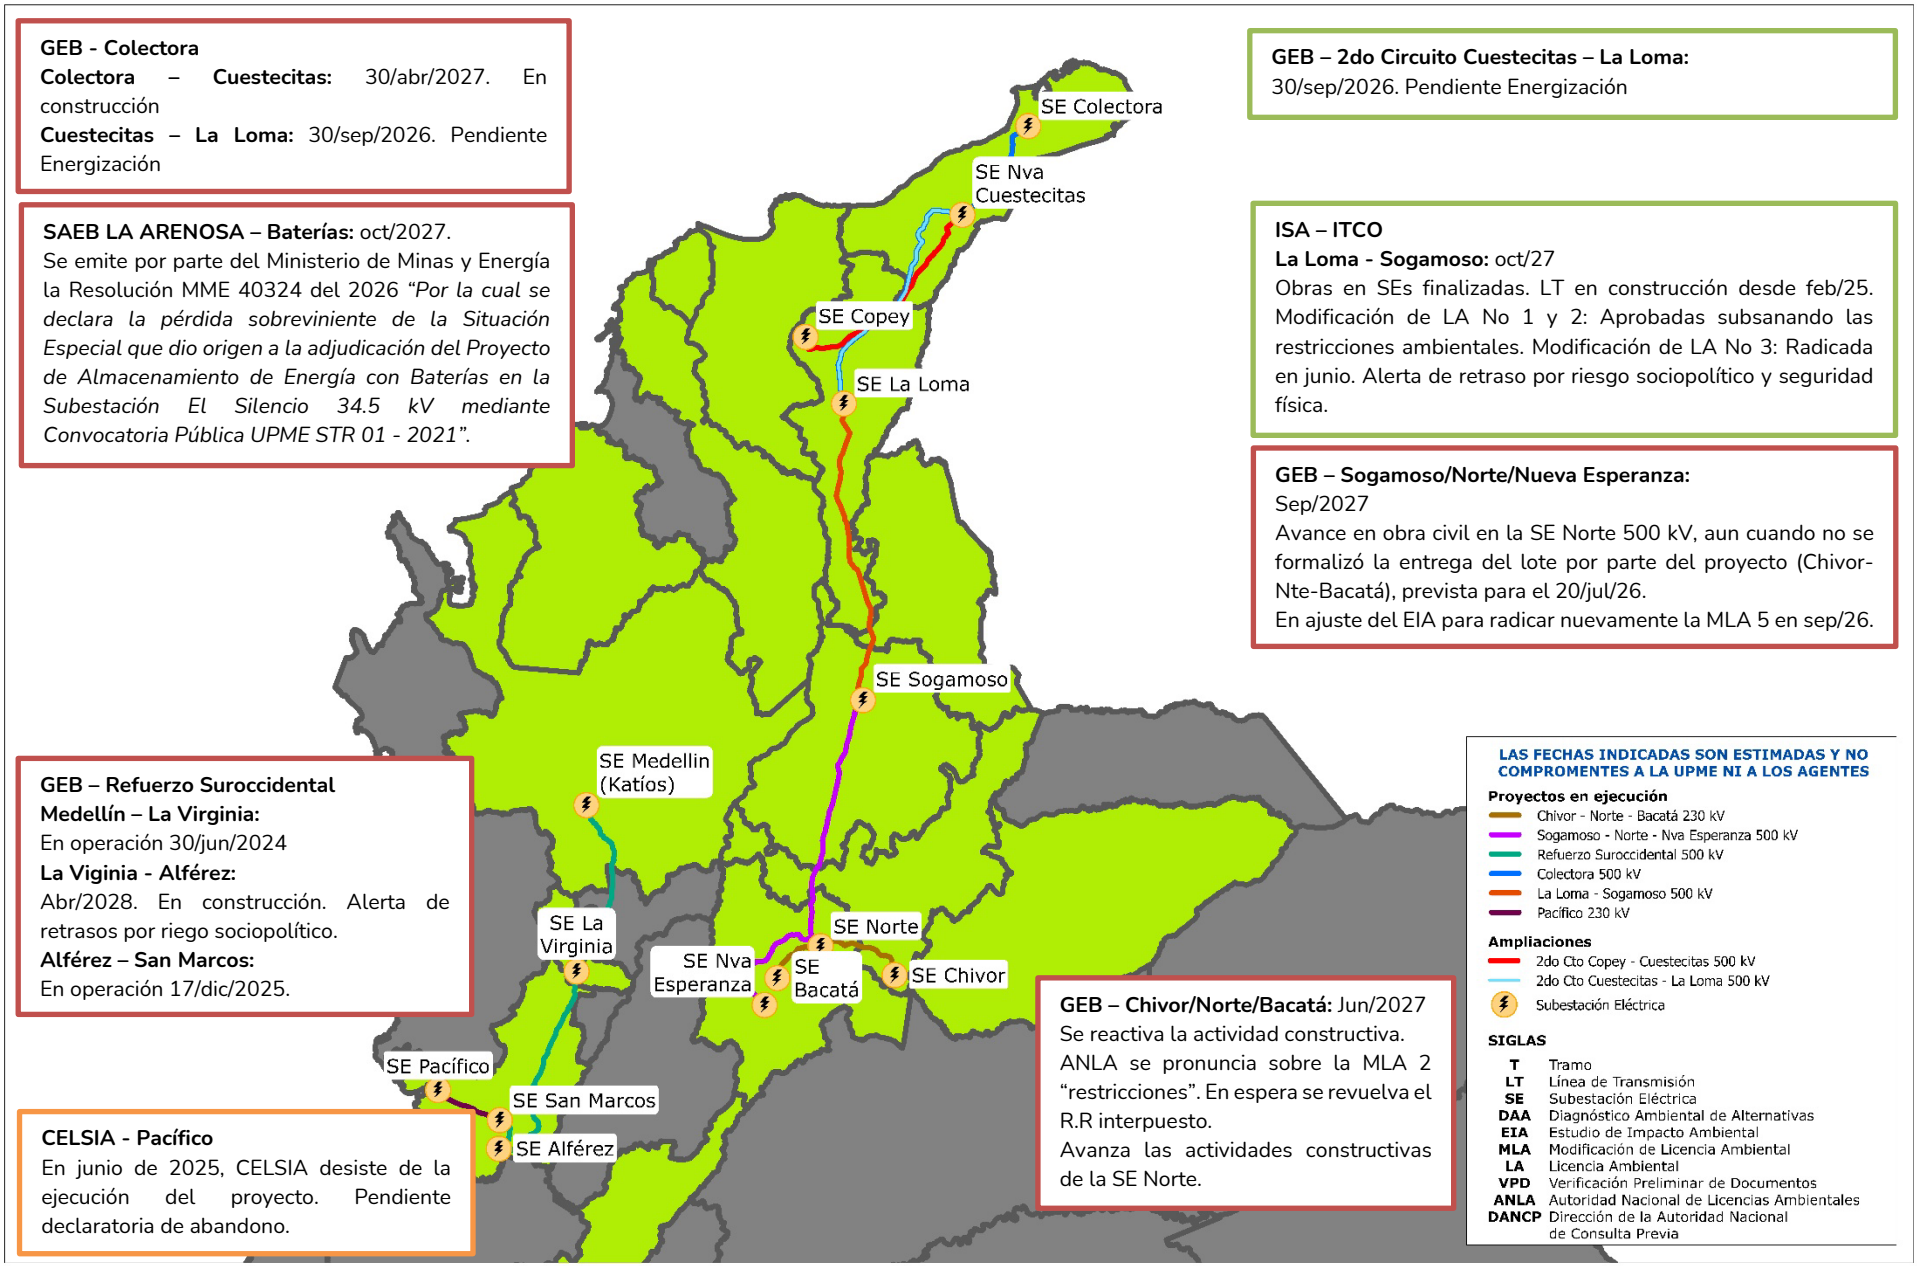

Recuerde: *Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera* ***"Copia No Controlada"****. La versión vigente se encuentra publicada en el Sistema de Gestión Único Estratégico de Mejoramiento - SIGUEME.*

GEB – Tercer Transformador Bolívar: Ago/2026
Reanudación de obras civiles y montaje de equipos. Avanza implementación de las medidas del PMA.

ISA – Pasacaballos: Mar/2028
En elaboración de EIA previsto radicar en el mes de octubre de 2026 El proyecto ya cuenta con predio para la ubicación de la SE.


CELSIA - Carreto: Mar/2027
L.A otorgada con Res 002067 de 2025. Continuo monitoreo arqueológico (sin hallazgos). Se reportan alteraciones de orden público en el área de intervención del proyecto.

CELSIA – 2do Circuito Sahagún: May/2027
LA otorgada a partir de la Res. 0891 del 25/mar/2026.

ISA ITCO – Carrieles: Dic/2026
En construcción. LT 93,49% de avance y SE 71,68% de avance. MLA otorgada mediante Res 00086 de 25/03/2026.

EPM – Bahía Nueva Esperanza: EPM declaro en operación el proyecto el 30 de agosto de 2026 a partir de las 20:00 horas.

GEB – Huila: Ago/2026
Finalización del monitoreo arqueológico. Sin hallazgos arqueológicos. Se reporta cumplimiento de obligaciones establecidas en la LA del proyecto.

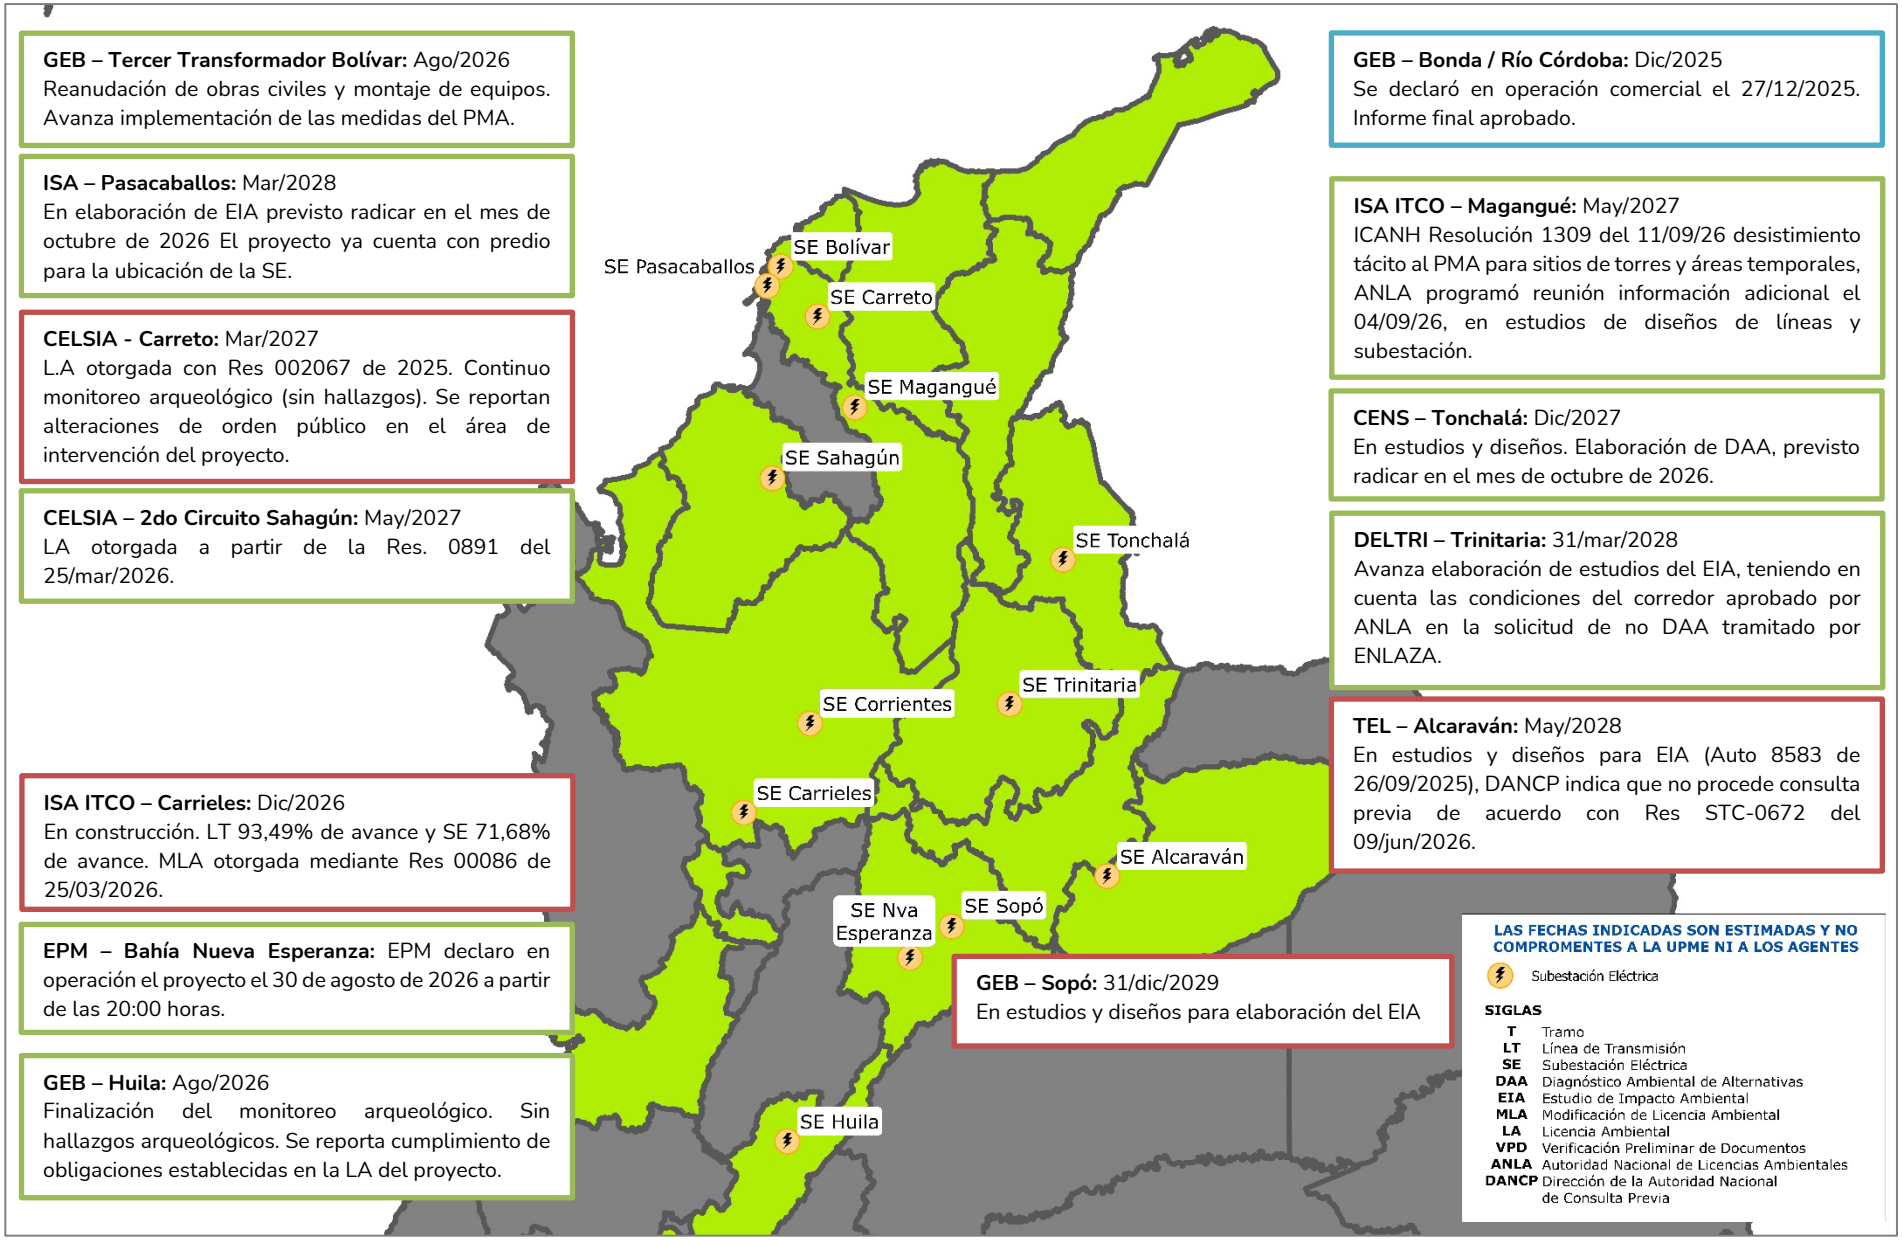

GEB – Bonda / Río Córdoba: Dic/2025
Se declaró en operación comercial el 27/12/2025. Informe final aprobado.

ISA ITCO – Magangué: May/2027
ICANH Resolución 1309 del 11/09/26 desistimiento tácito al PMA para sitios de torres y áreas temporales, ANLA programó reunión información adicional el 04/09/26, en estudios de diseños de líneas y subestación.

CENS – Tonchalá: Dic/2027
En estudios y diseños. Elaboración de DAA, previsto radicar en el mes de octubre de 2026.

DELTRI – Trinitaria: 31/mar/2028
Avanza elaboración de estudios del EIA, teniendo en cuenta las condiciones del corredor aprobado por ANLA en la solicitud de no DAA tramitado por ENLAZA.

TEL – Alcaraván: May/2028
En estudios y diseños para EIA (Auto 8583 de 26/09/2025), DANCP indica que no procede consulta previa de acuerdo con Res STC-0672 del 09/jun/2026.

GEB – Sopó: 31/dic/2029
En estudios y diseños para elaboración del EIA

LAS FECHAS INDICADAS SON ESTIMADAS Y NO COMPROMENTES A LA UPME NI A LOS AGENTES

Subestación Eléctrica

SIGLAS

T	Tramo
LT	Línea de Transmisión
SE	Subestación Eléctrica
DAA	Diagnóstico Ambiental de Alternativas
EIA	Estudio de Impacto Ambiental
MLA	Modificación de Licencia Ambiental
LA	Licencia Ambiental
VPD	Verificación Preliminar de Documentos
ANLA	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
DANCP	Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa

Recuerde: *Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera* ***"Copia No Controlada"****. La versión vigente se encuentra publicada en el Sistema de Gestión Único Estratégico de Mejoramiento - SIGUEME.*

GEB - Colectora
Colectora – Cuestecitas: 31/mar/2027. En construcción
Cuestecitas – La Loma: 31/ago/2026. Pendiente Energización

SAEB LA ARENOSA – Baterías: oct/2027.
Lote en trámite. No han dado orden de compra SAEB.
Solicitud de revocatoria por parte del inversionista.

GEB – 2do Circuito Cuestecitas – La Loma:
31/ago/2026. Pendiente Energización


ISA – ITCO
La Loma - Sogamoso: oct/27
Obras en SEs finalizadas. LT en construcción desde feb/25. Retrasos por restricciones ambientales y sociales. Modificación de LA No 1 y 2: Aprobadas subsanando las restricciones ambientales. Modificación de LA No 3: Radicada en junio. Alerta de retraso por riesgo sociopolítico.

GEB – Sogamoso/Norte/Nueva Esperanza:
Sep/2027
Avance en obra civil en la SE Norte 500 kV, aun cuando no se formalizó la entrega del lote por parte del proyecto (Chivor-Nte-Bacatá), prevista para el 20/jul/26.
En firme la MLA para la llegada a la S/E Norte 500kV, MLA "restricciones" y MLA "Aprovechamiento Forestal".
En elaboración del EIA para radicar MLA 5 en agosto/26.

GEB – Refuerzo Suroccidental
Medellín – La Virginia:
En operación 30/jun/2024
La Viginia - Alférez:
Abr/2028. En construcción. Alerta de retrasos por riego sociopolítico.
Alférez – San Marcos:
En operación 17/dic/2025.

CELSIA - Pacífico
En junio de 2025, CELSIA desiste de la ejecución del proyecto. Pendiente declaratoria de abandono.

GEB – Chivor/Norte/Bacatá: Jul/2027
Se reactiva la actividad constructiva.
ANLA se pronuncia sobre la MLA 2 "restricciones". Se interpuso R.R.
La MLA 3 de la S/E Norte quedó en firme y se dio inicio al contrato para la construcción.

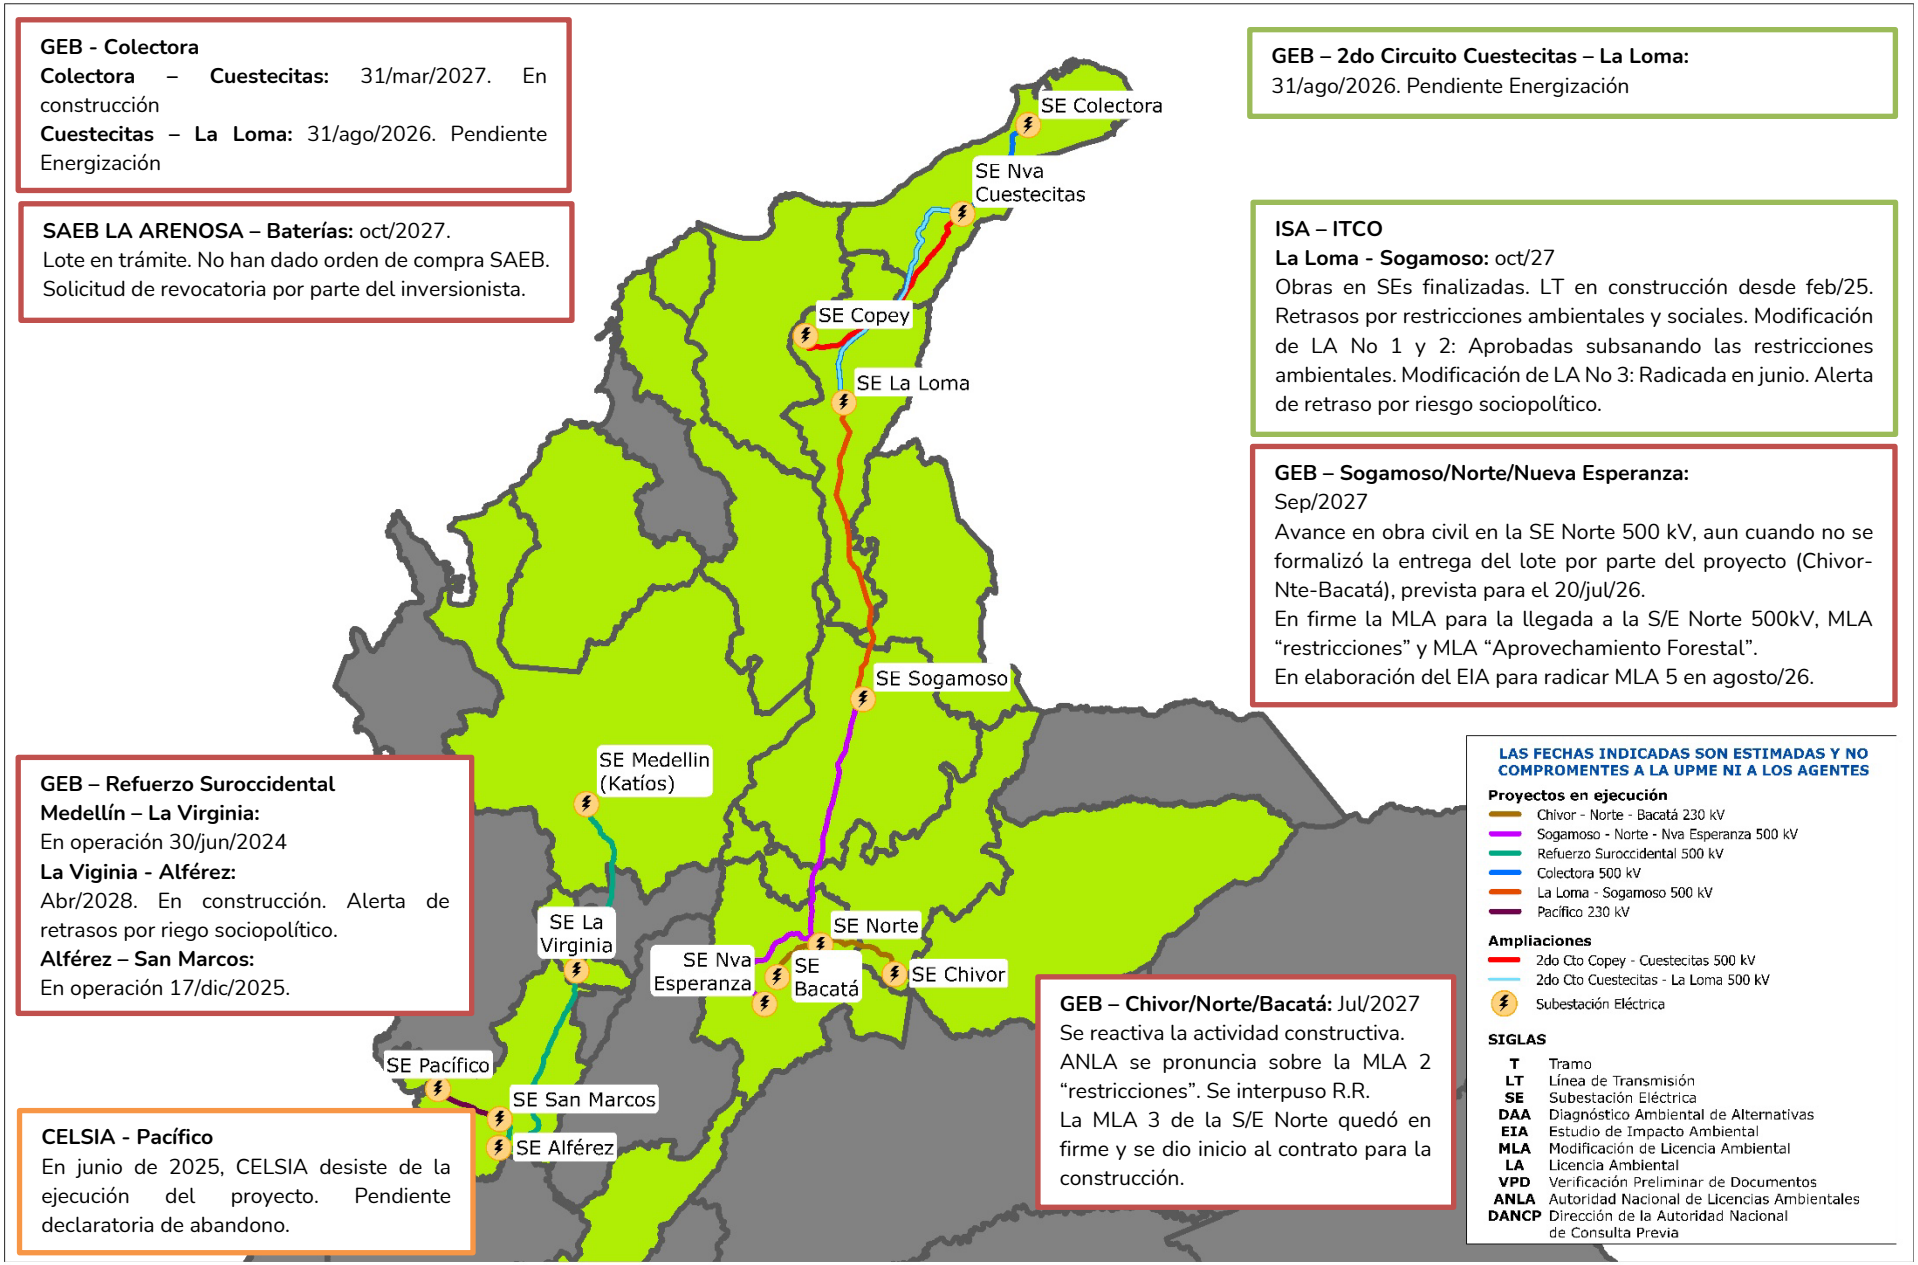

Recuerde: *Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera* ***"Copia No Controlada"****. La versión vigente se encuentra publicada en el Sistema de Gestión Único Estratégico de Mejoramiento - SIGUEME.*

GEB – Tercer Transformador Bolívar:
Ago/2026
Reanudación de obras civiles y montaje de equipos. Avanza implementación de las medidas del PMA.

ISA – Pasacaballos: Mar/2028
En elaboración de EIA.


CELSIA - Carreto: Mar/2027
LA otorgada con Res 002067 de 2025. Finaliza aprovechamiento forestal en la SE. Se reportan alteraciones de orden público en el área de intervención del proyecto.

CELSIA – 2do Circuito Sahagún: May/2027
LA otorgada con Res 0891 del 25/mar/2026.

ISA ITCO – Carrieles: Dic/2026
En construcción. LT 93,28% de avance y SE 68,25% de avance. MLA otorgada mediante Res 00086 de 25/03/2026.

EPM – Bahía Nueva Esperanza: 10/sep/2026
En desarrollo de pruebas de control y protección.

GEB – Huila: Ago/2026
Finalización del monitoreo arqueológico. Sin hallazgos arqueológicos. Se reporta cumplimiento de obligaciones establecidas en la LA del proyecto.

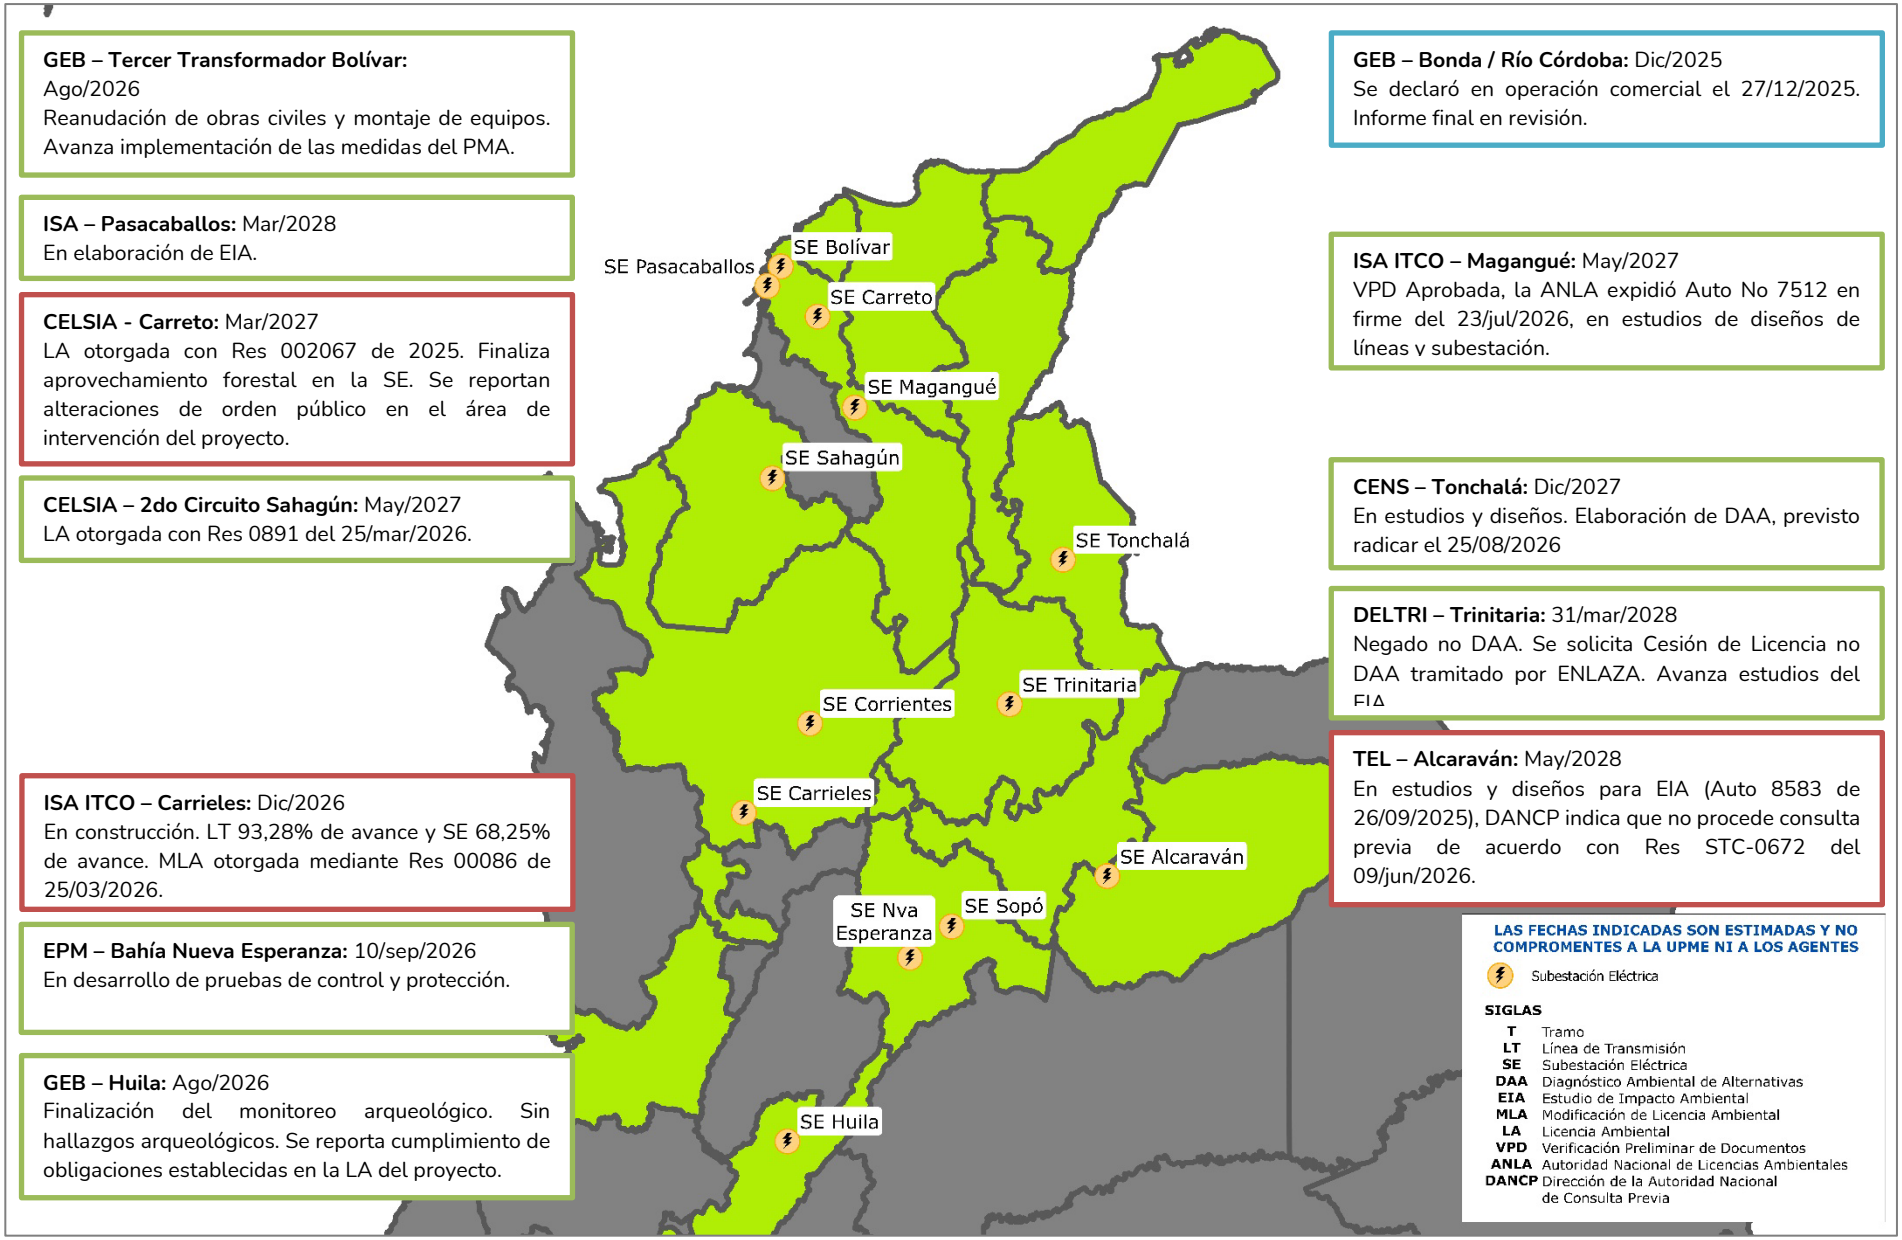

GEB – Bonda / Río Córdoba: Dic/2025
Se declaró en operación comercial el 27/12/2025. Informe final en revisión.

ISA ITCO – Magangué: May/2027
VPD Aprobada, la ANLA expidió Auto No 7512 en firme del 23/jul/2026, en estudios de diseños de líneas y subestación.

CENS – Tonchalá: Dic/2027
En estudios y diseños. Elaboración de DAA, previsto radicar el 25/08/2026

DELTRI – Trinitaria: 31/mar/2028
Negado no DAA. Se solicita Cesión de Licencia no DAA tramitado por ENLAZA. Avanza estudios del EIA


TEL – Alcaraván: May/2028
En estudios y diseños para EIA (Auto 8583 de 26/09/2025), DANCP indica que no procede consulta previa de acuerdo con Res STC-0672 del 09/jun/2026.

Recuerde: *Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera* ***"Copia No Controlada"****. La versión vigente se encuentra publicada en el Sistema de Gestión Único Estratégico de Mejoramiento - SIGUEME.*

Unidad de Planeación Minero Energética

Avance proyectos convocatorias: 30/07/2026

Las fechas indicadas son estimadas y no compromete a la UPME ni a los agentes

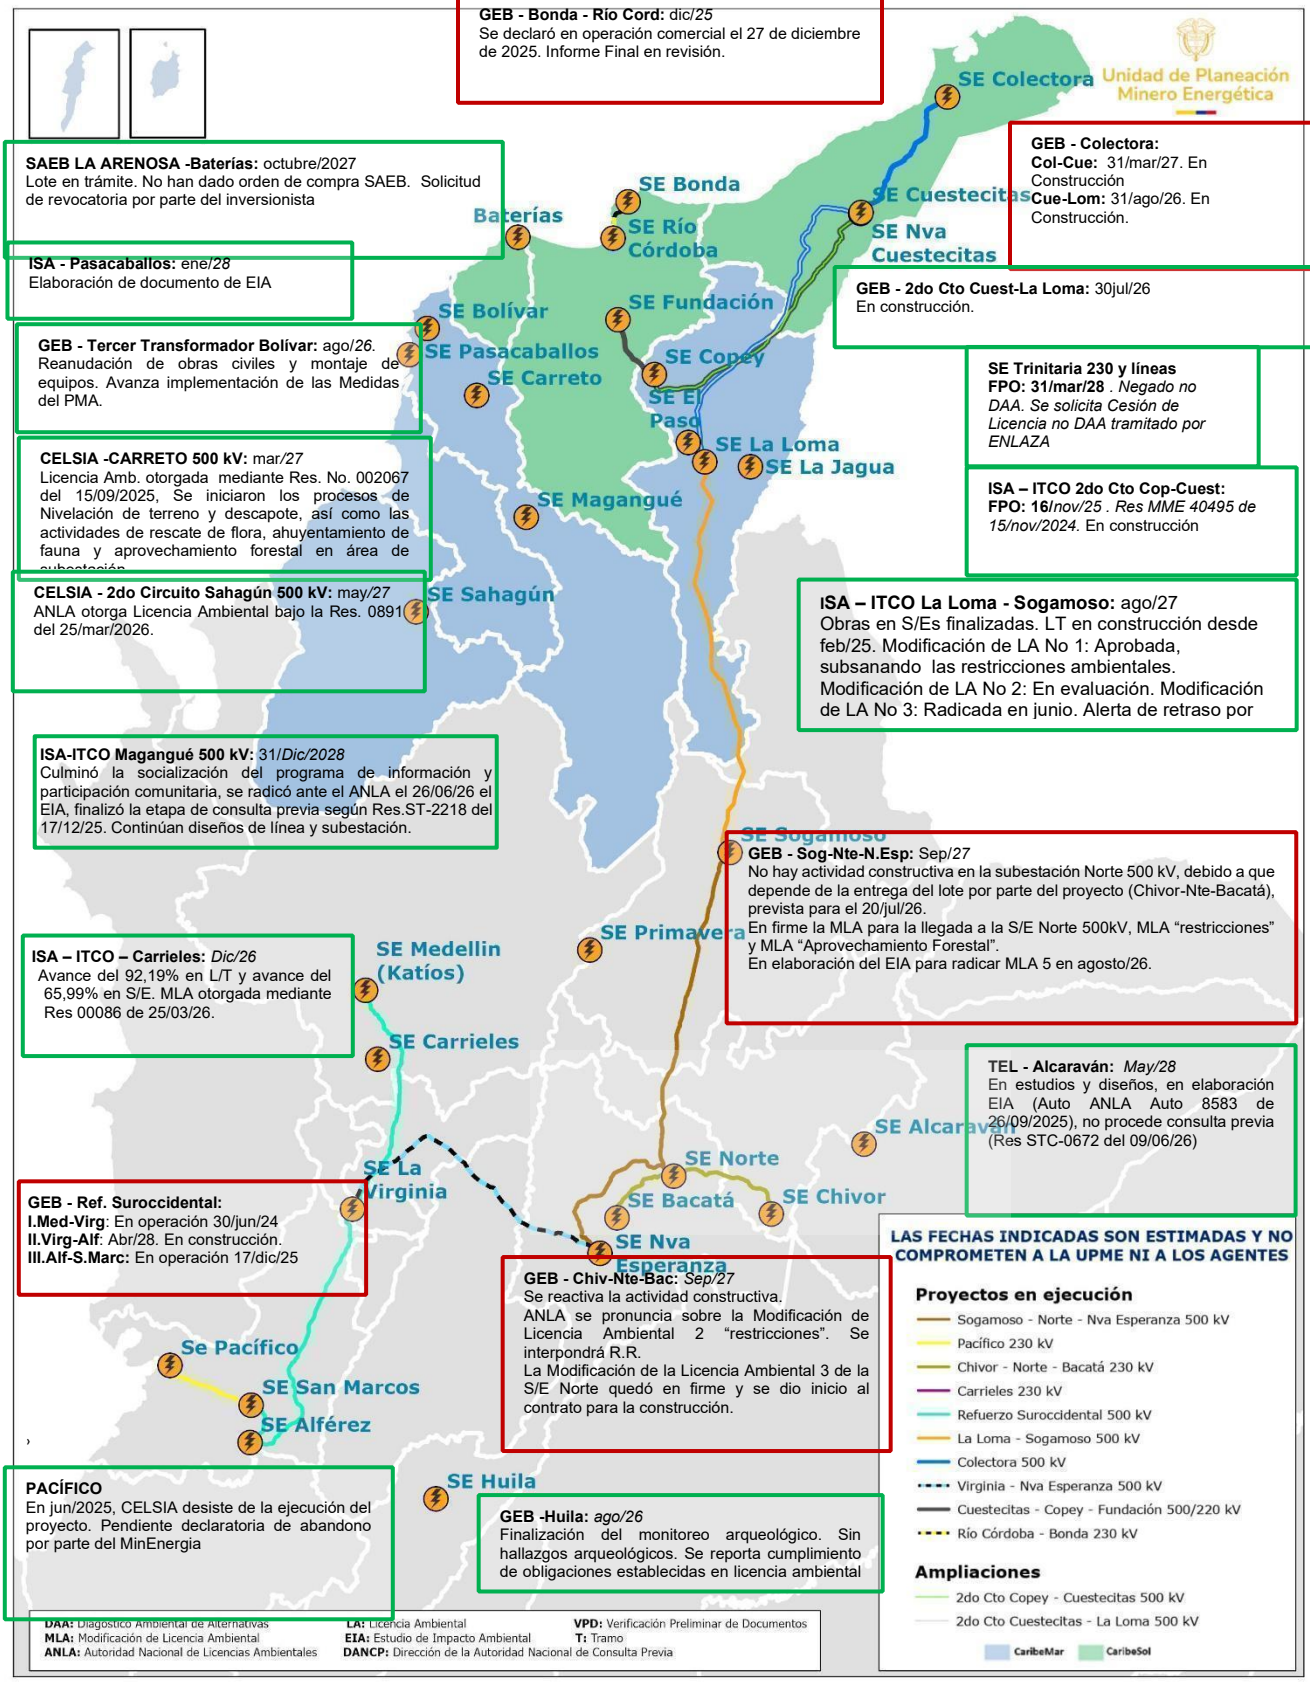


*Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera **"Copia No Controlada"**. La versión vigente se encuentra publicada en el Sistema de Gestión Único Estratégico de Mejoramiento - SIGUEME.*


Unidad de Planeación Minero Energética

Avance proyectos convocatorias: 30/06/2026

Las fechas indicadas son estimadas y no compromete a la UPME ni a los agentes

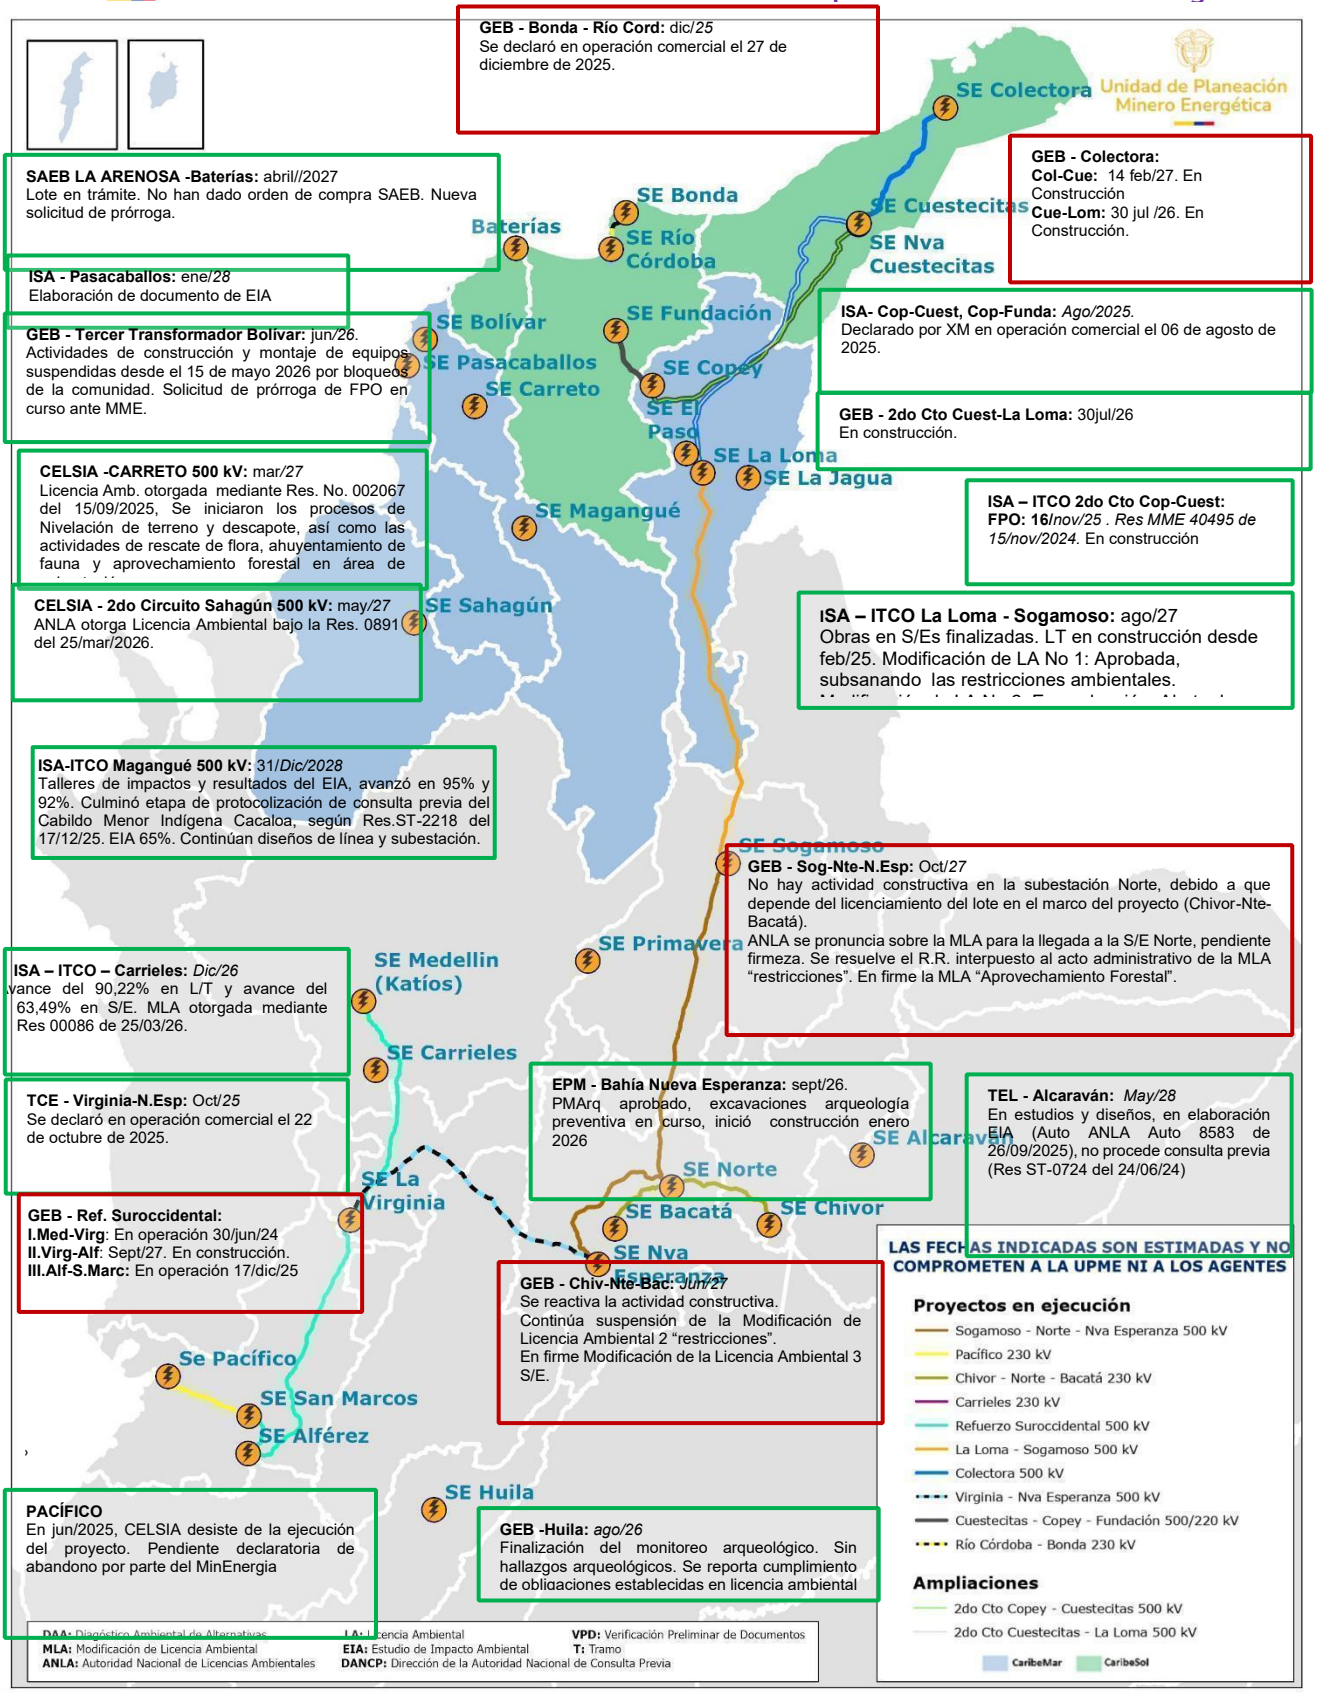

*Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera **"Copia No Controlada"**. La versión vigente se encuentra publicada en el Sistema de Gestión Único Estratégico de Mejoramiento - SIGUEME.*

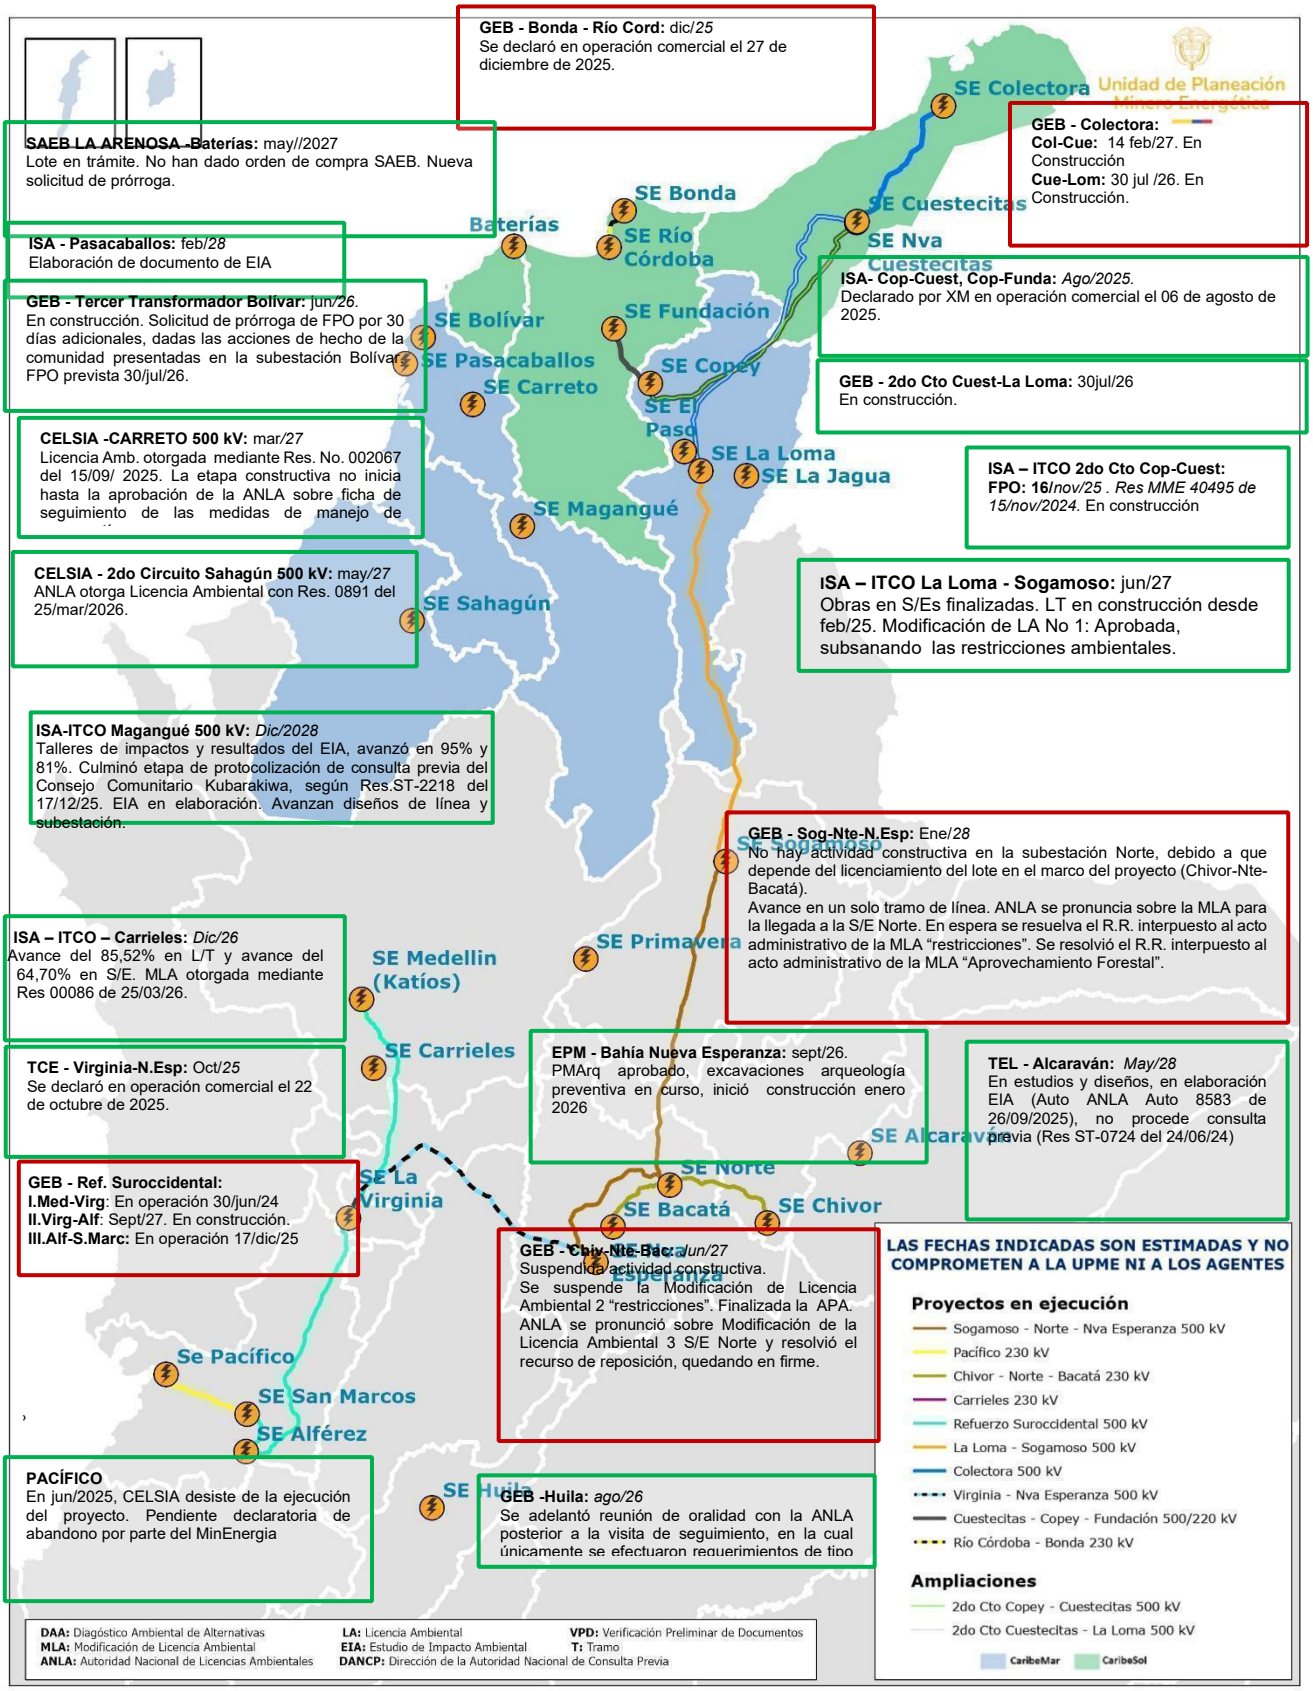


*Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera **"Copia No Controlada"**. La versión vigente se encuentra publicada en el Sistema de Gestión Único Estratégico de Mejoramiento - SIGUEME.*

Unidad de Planeación Minero Energética

Avance proyectos convocatorias: 04/05/2026

Las fechas indicadas son estimadas y no compromete a la UPME ni a los agentes

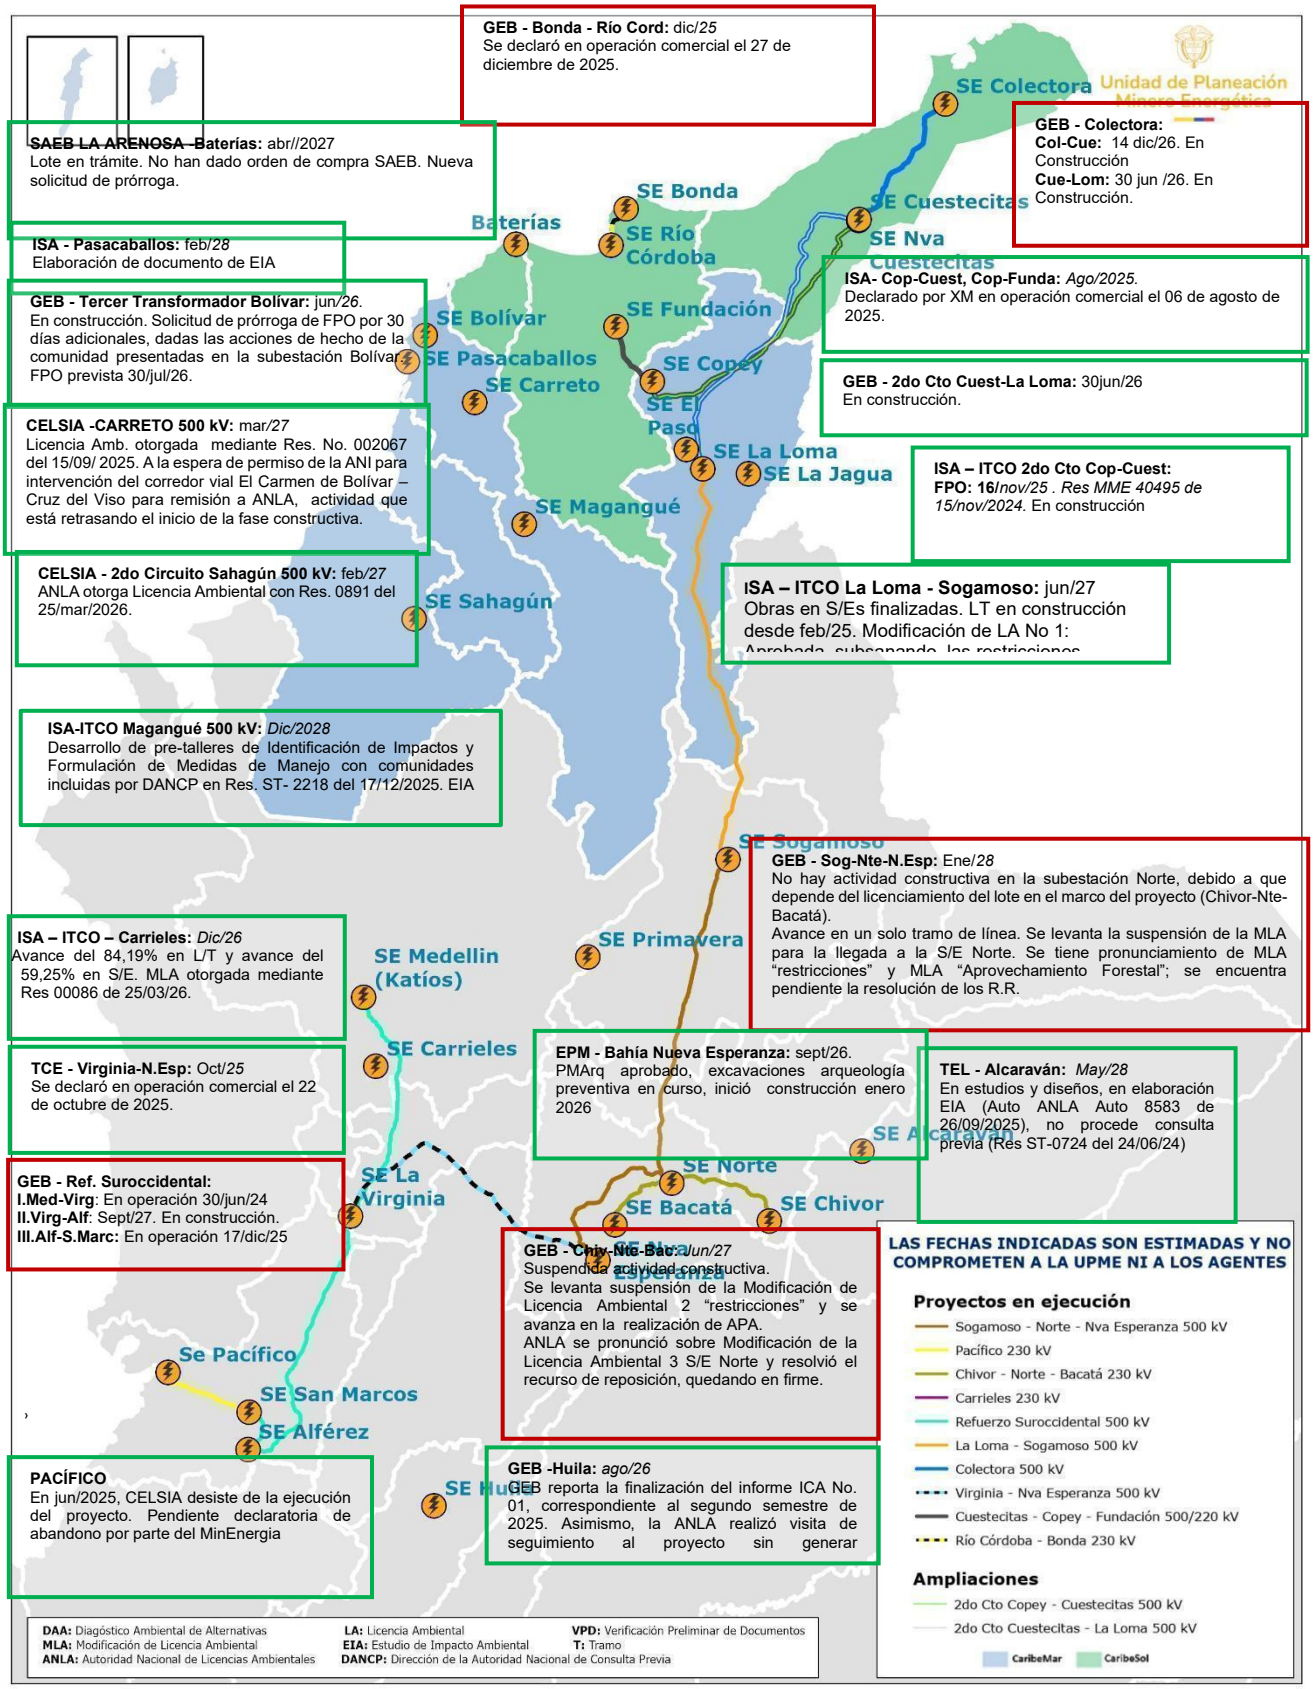


Recuerde: *Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera* ***"Copia No Controlada"****. La versión vigente se encuentra publicada en el Sistema de Gestión Único Estratégico de Mejoramiento - SIGUEME.*

Unidad de Planeación Minero Energética

Avance proyectos convocatorias: 26/03/2026

Las fechas indicadas son estimadas y no compromete a la UPME ni a los agentes

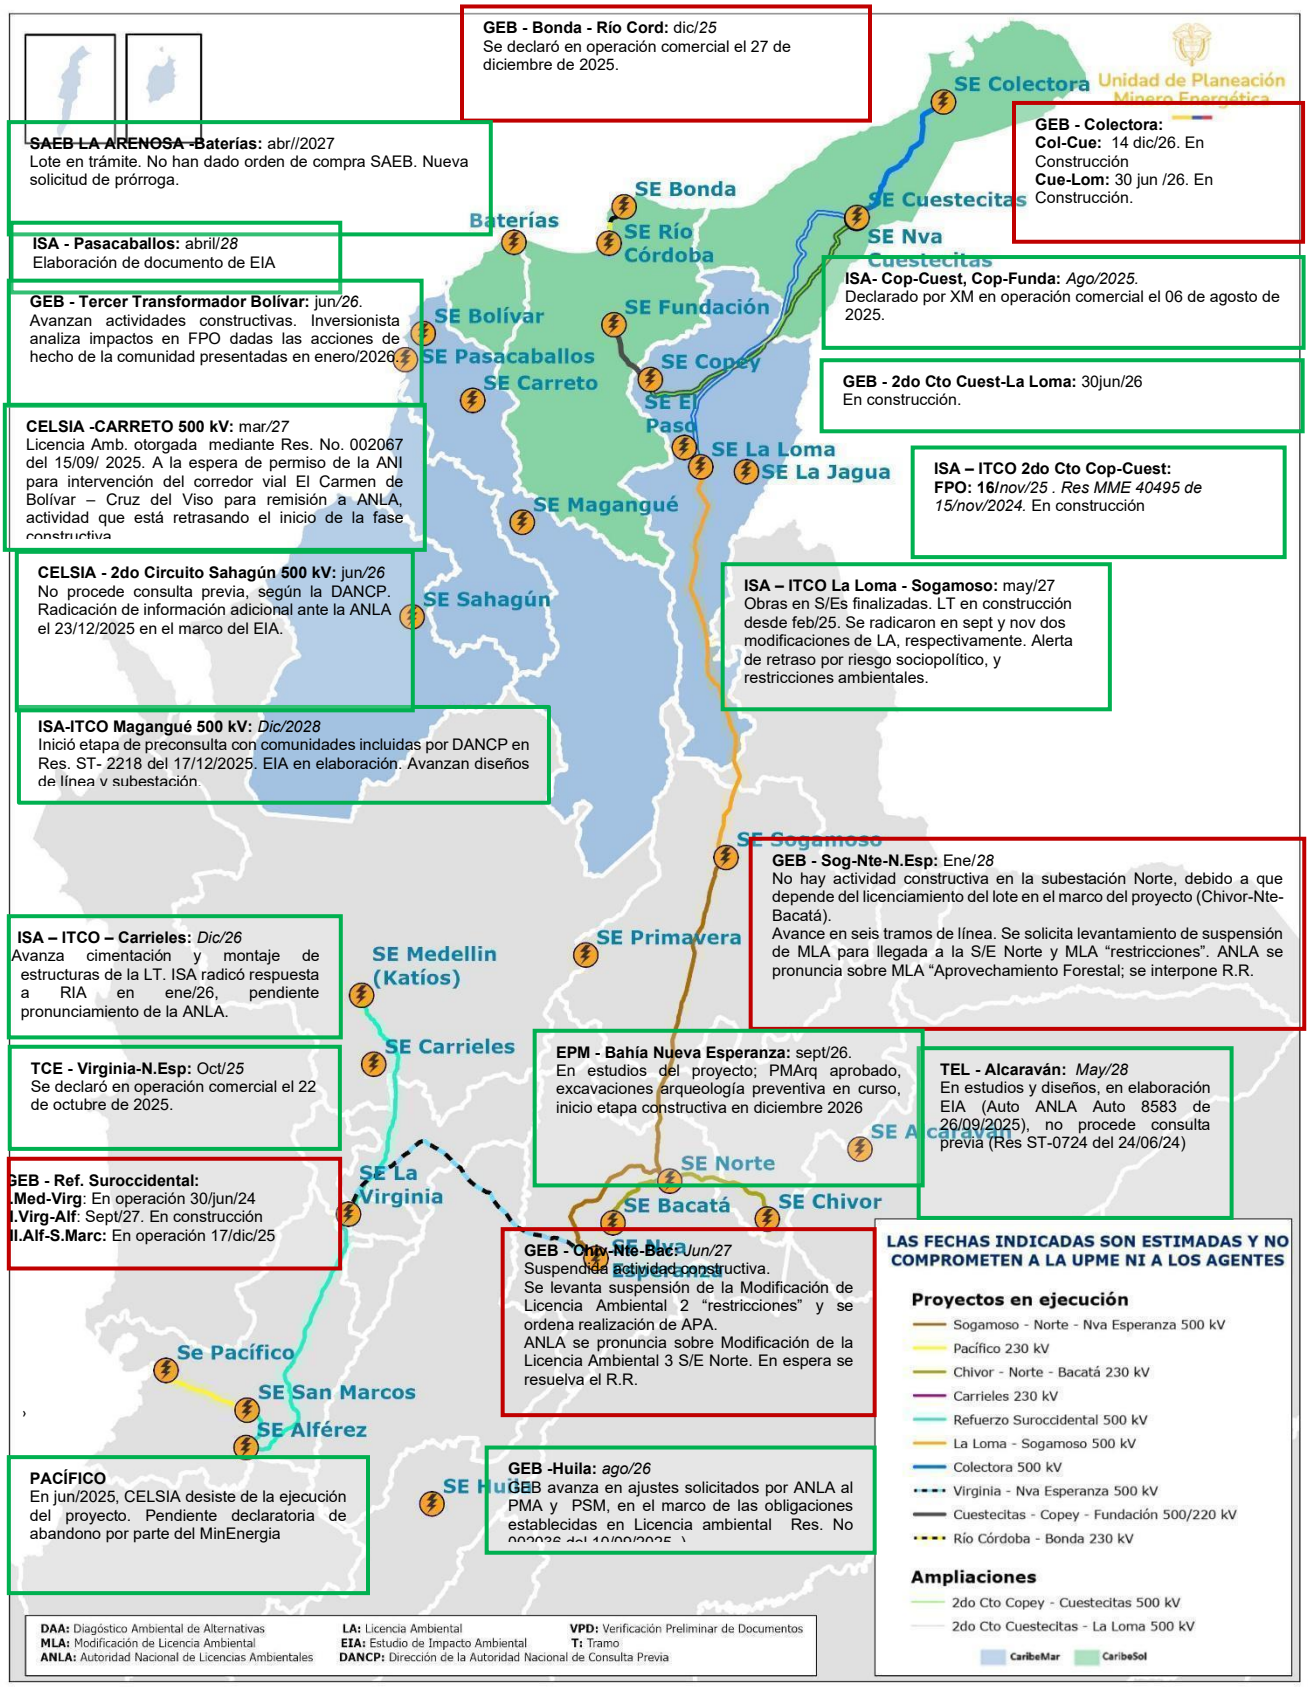


*Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera **"Copia No Controlada"**. La versión vigente se encuentra publicada en el Sistema de Gestión Único Estratégico de Mejoramiento - SIGUEME.*


Unidad de Planeación Minero Energética

Avance proyectos convocatorias: 03/03/2026

Las fechas indicadas son estimadas y no compromete a la UPME ni a los agentes

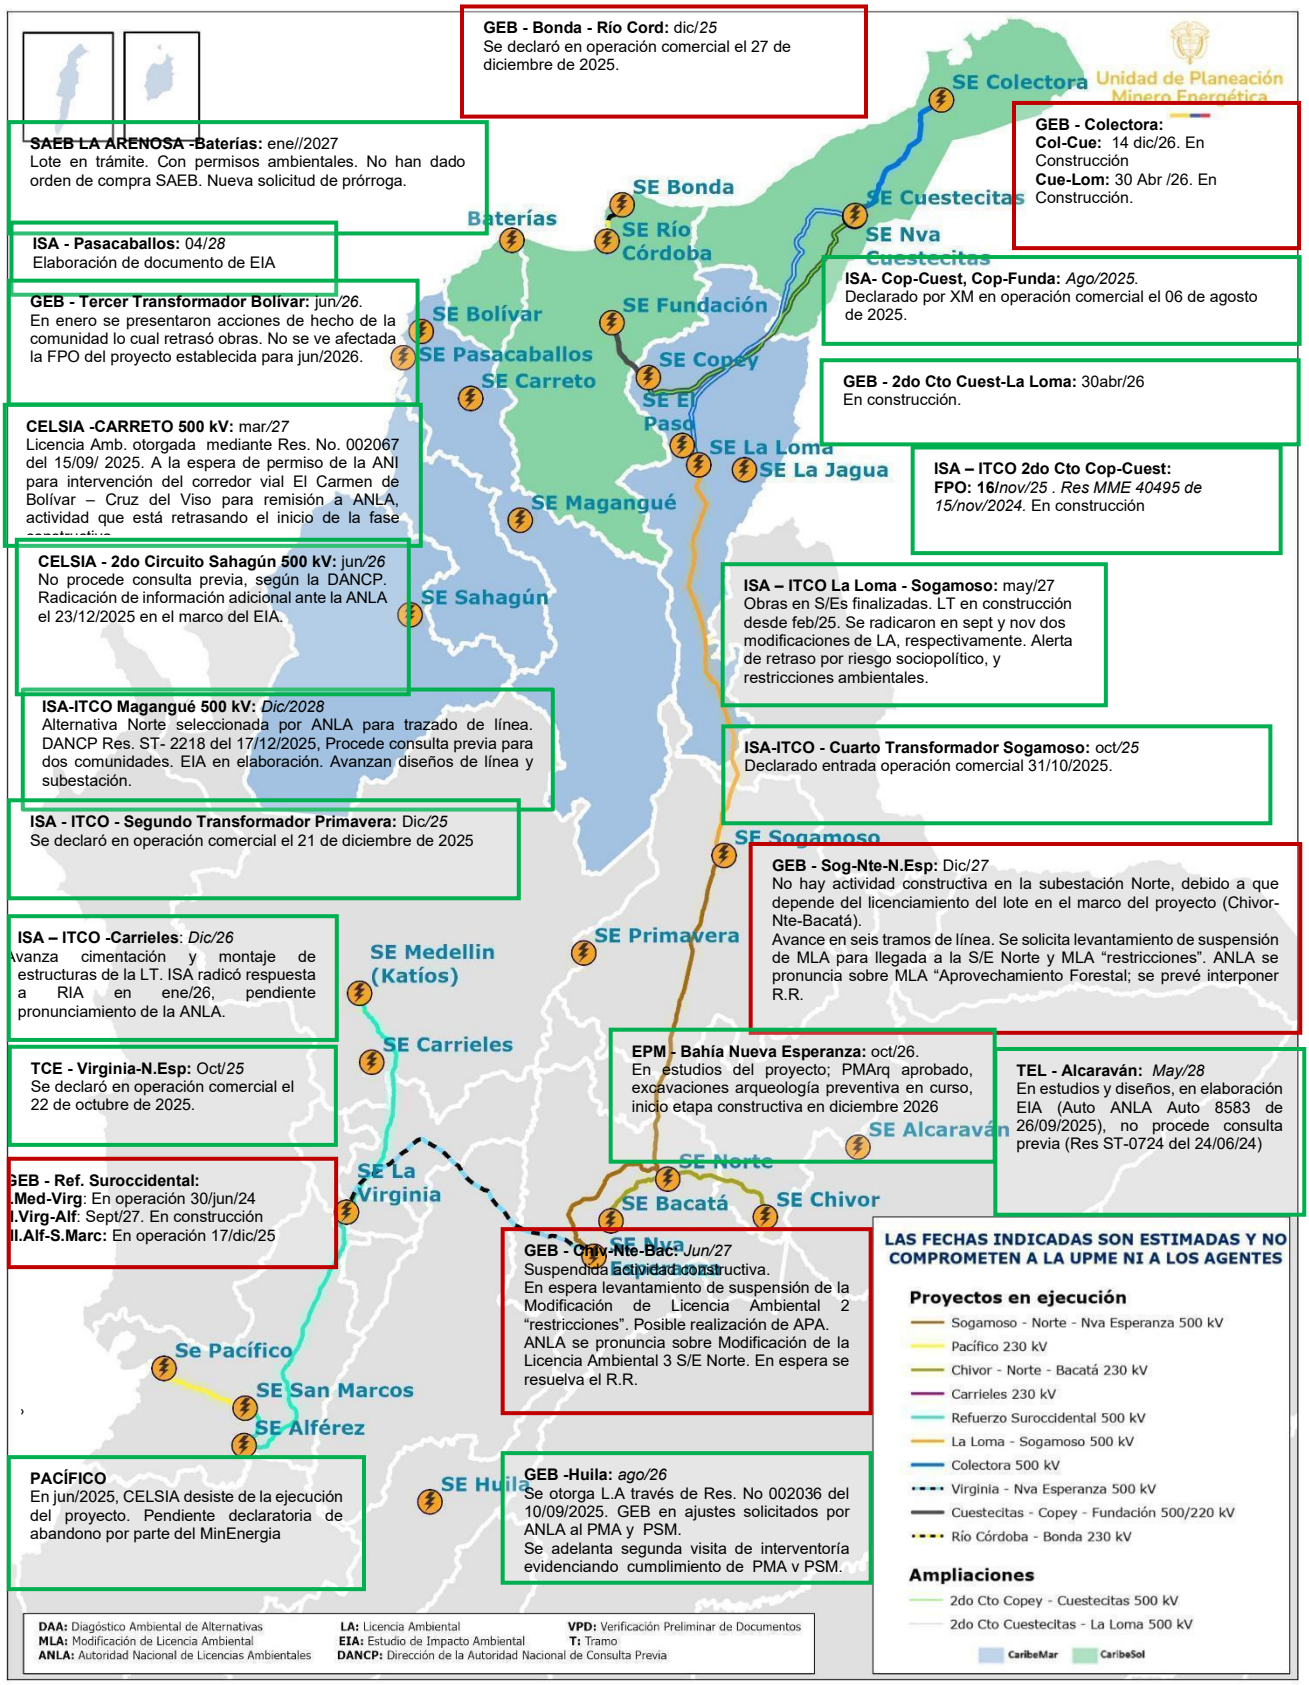

*Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera **"Copia No Controlada"**. La versión vigente se encuentra publicada en el Sistema de Gestión Único Estratégico de Mejoramiento - SIGUEME.*

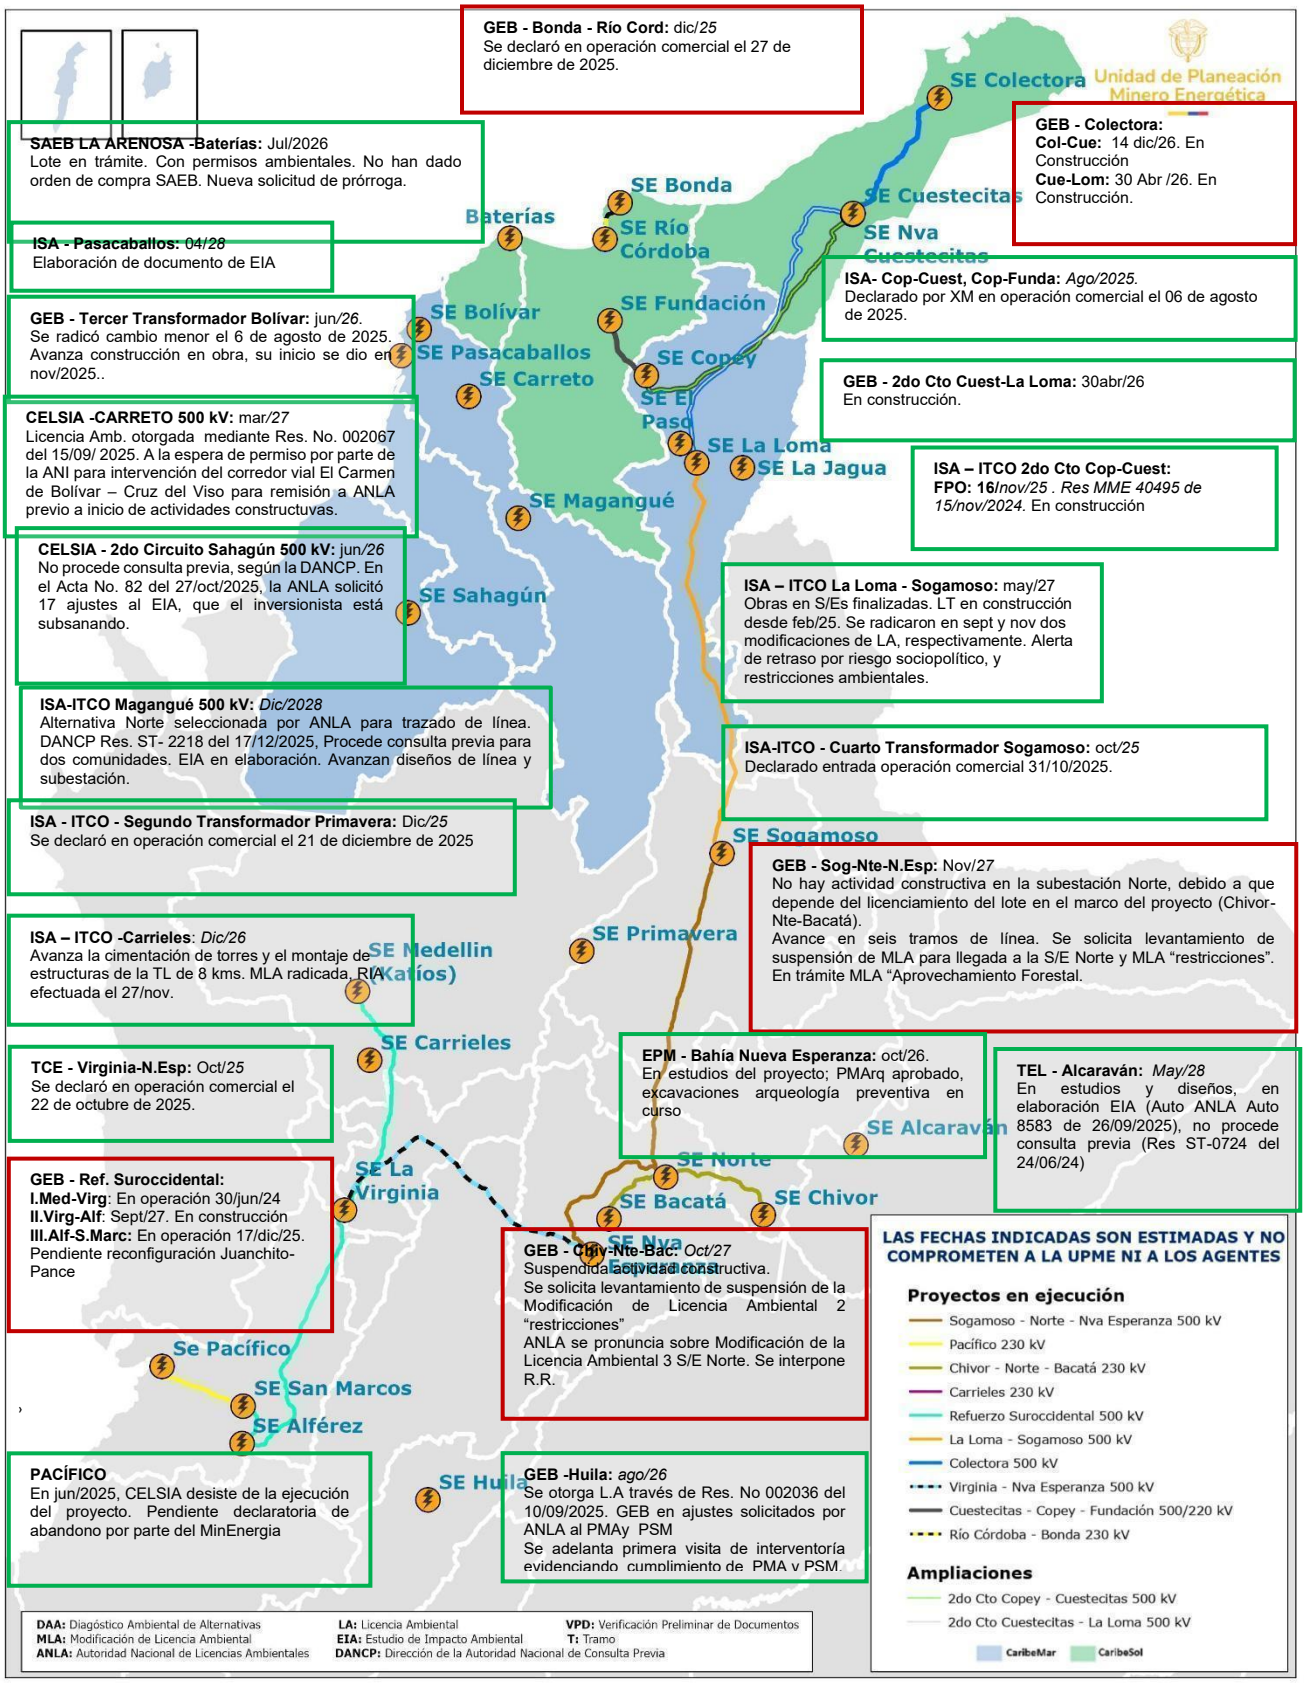

Recuerde: *Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera* ***"Copia No Controlada"****. La versión vigente se encuentra publicada en el Sistema de Gestión Único Estratégico de Mejoramiento - SIGUEME.*
